

社会資本総合整備計画 (事後評価)

令和3年3月5日

計画の名称	木戸口公園長寿命化計画							重点配分対象の該当				
計画の期間	平成30年度 ~ 平成30年度 (1年間)			交付対象	播磨高原広域事務組合							
計画の目標	公園施設の長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を行う事により、公園利用者の安全・安心を確保する。、											
計画の成果目標 (定量的指標)	長寿命化計画により平成30年度までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を0%から100%に向上させる。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考				
						当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)				
	長寿命化計画によりH30末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を測定する。 (更新達成率) = (目標年次における更新済みの公園施設数) / (H30末までの更新を目標とする公園施設数) × 100 (%)					0%		100%				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	200百万円	A	200百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	R1	R2	R3	R4				
A-1	公園	一般	播磨高原広域事務組合	直接	播磨高原広域事務組合	公園施設長寿命化対策支援事業	サッカーコート更新 2面	上郡町						200	3.3	策定済	
									合計					200			

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計					0			

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H26	H27	H28	H29	H30			
									合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

交付金の執行状況



(単位:百万円)

	H30	R1	R2	R3	R4
配分額 (a)	18				
計画別流用 増△減額 (b)	35				
交付額 (c=a+b)	53				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	18				
翌年度繰越額 (f)	35				
うち未契約繰越額 (g)	35				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	66.0%				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工事実施に当たり、地元調整に日数を要した。				

※ 平成30年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	木戸口公園長寿命化計画	交付対象	播磨高原広域事務組合
計画の期間	平成30年度 ～ 平成30年度（1年間）		

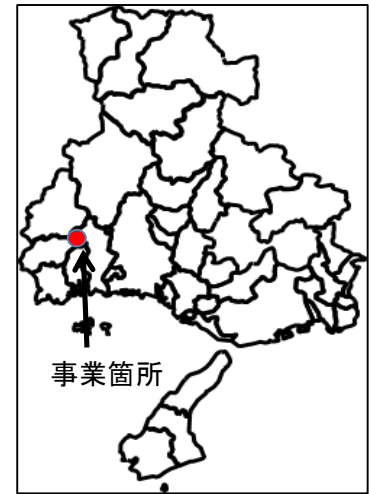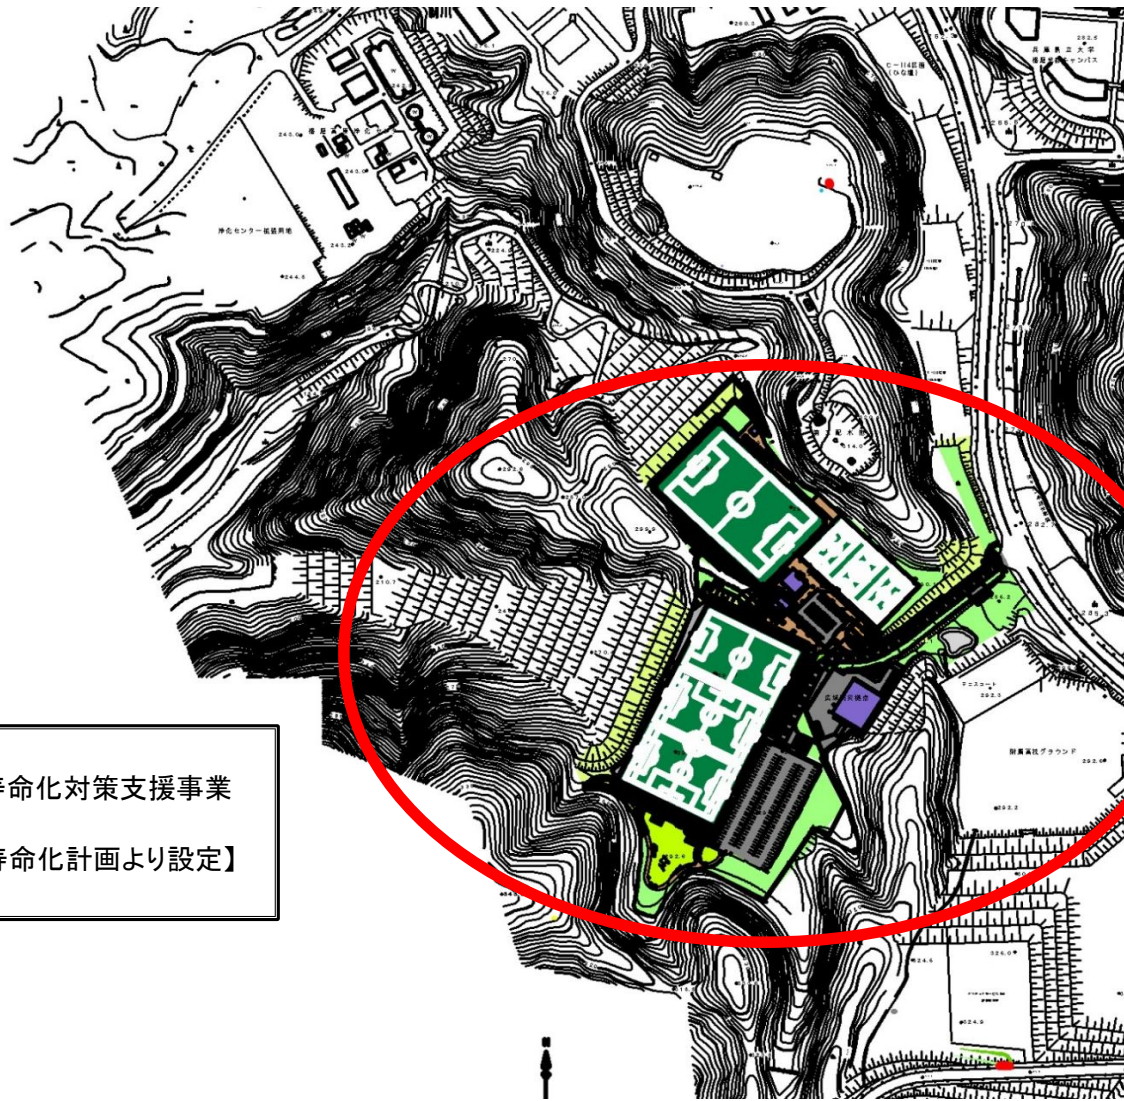

A-1:公園施設長寿命化対策支援事業
【事業箇所:H29長寿命化計画より設定】
